




BİLECİK ÜNİVERSİTESİ



2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2010



1. YÖNETİCİ ÖZETİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, ekonomik, saydam ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda kullanılması esası getirilmiştir.

Kamu mali yönetimine yeni birçok yaklaşım getiren söz konusu Kanunun 25'inci maddesinde; yatırım programında projesi bulunan kamu idarelerinin bu projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla ilgili kuruluşlara göndereceği hükmüne yer verilmiştir.

Üniversitemiz 2007 yılında 5662 sayılı Kanunla kurulmuş olup gelişen teknolojiye uygun hizmet binaları, makine teçhizatları, bilgisayarları, derslik ve laboratuvarlarıyla birlikte öğrencilerine kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetini sunmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda; 2009 yılında kısıtlı bütçe imkânlarıyla tadilat görmemiş hizmet binaları ile dersliklerin bakım onarımları yapılmaya çalışılmış, öğretim görevlisi ile öğrenciler için bilgisayarlar ve kitaplar alınmıştır. Diğer taraftan kampus alt yapısı ile derslik binalarına başlanılmış, İ.İ.B.F. ve Osmaneli MYO için basketbol-voleybol sahası, Söğüt MYO ve Pazaryeri MYO için mini halı saha ve basketbol-voleybol sahaları yapılmıştır.

Üniversitemizin yeni kurulması nedeniyle gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisleri ile buralarda kullanılacak makine-teçhizat, bilgisayar vb. donanımlara ihtiyacı bulunmakta olup verilen bütçe ödenekleriyle hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca Üniversitemizin 2009 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Azmi ÖZCAN
Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1 Kuruluşun, Misyonu:

Kaliteli öğretim ve araştırma yapılabilmesi için akademik, fiziki, ve teknik yapılanmasını tamamlayarak, evrensel bilime ve kültüre katkı sağlayacak bilgi, teknoloji ve değer üreten; insanlığın temel değerlerine ve hukuka saygılı, alanında yetkin, sorumluluk sahibi, araştırmacı, sorgulayıcı, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek; fen, mühendislik ve sosyal bilimler alanında nitelikli bilimsel araştırmalar ve yayınlar yaparak bilime katkıda bulunmaktadır.

2.2 Kuruluşun, Vizyonu:

Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar konusunda tercih edilen, kurumsal kimliği ve kültürü gelişmiş bir üniversite olmaktır.

2.3 Kuruluşun Yatırımların Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanunda II. Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

Özel Bütçe gelirleri :

- Hazine yardımı
- Öz gelirler (Örgün ve ikinci öğretim harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, tezli ve tezsiz yüksek lisans gelirleri, kira gelirleri ve diğer gelirler)

2009 yılındaki yatırımlarımız; Bütçe Kanunuyla Üniversitemiz için uygun görülen hazine yardımları ile finanse edilmiştir.

2.4 Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi:

Üniversitemizde birimlere ait mevcut derslik, laboratuvar ve atölye sayıları ile öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Adı	Derslik Sayısı (Ad.)	Lab. Atölye Sayısı (Ad.)	Öğrenci Sayısı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	15	2	2062
Mühendislik Fakültesi	9	4	246
Fen-Edebiyat Fakültesi	3	0	61
Fen Bilimleri Enstitüsü	0	0	34
Sosyal Bilimler Enstitüsü	0	0	103
Meslek Yüksekokulu	16	17	1355
Söğüt Meslek Yüksekokulu	14	6	836
Pazaryeri Meslek Yüksekokulu	11	5	971
Osmaneli Meslek Yüksekokulu	9	1	832
Gölpazarı Meslek Yüksekokulu	6	2	519
Bozüyük Meslek Yüksekokulu	13	3	493

2.5 2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:

Üniversitemizde; 2009 yılında yatırım programında yer alan ve gerçekleştirilmesi planlanan kapalı spor salonunun tiribün yapımı işi ile kampus alt yapısı ile derslik binaları yapımına başlanılmış, İ.İ.B.F. ve Osmaneli MYO için basketbol-voleybol sahası, Söğüt MYO ve Pazaryeri MYO için mini halı saha ve basketbol-voleybol sahaları işleri tamamlanmıştır.

2.6 2009 Yılı Yatırım Uygulamaları :

- Genel Yatırım Uygulama Durumu:

Sektör	2009 Yılı Ödeneği (TL)		2009 Yılı Nakdi Gerçekleşme (TL)	2009 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	
	Program Ödenek	Revize Ödenek		Prog. Öd. Göre	Revize Öd. Göre
Eğitim	8.998.000	9.618.000	6.742.000	75	70
1-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	400.000	63.000	53.000		
2-Muhtelif İşler	1.856.000	2.813.000	2.682.000		
3-Kampüs Altyapısı	1.000.000	4.720.000	3.170.000		
4-Derslik ve Merkezi Birimler	4.742.000	1.022.000	426.000		
5-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.000.000	1.000.000	411.000		
Toplam	8.998.000	9.618.000	6.742.000	75	70

Üniversitemizin 2009H030570 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında gerçekleşen yatırım %84, 2009H030580 Muhtelif İşler kapsamında gerçekleşen yatırım %95, 2009H030590 Kampüs Altyapısı kapsamında gerçekleşen yatırım % 67, 2009H03600 Derslik ve Merkezi Birimler kapsamında gerçekleşen yatırım % 42, 2008H050100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri kapsamında gerçekleşen yatırım % 41 olmak üzere yatırım projeleri genel nakdi gerçekleşmesi oranı %70 olmuştur.

- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar :

Ödeneklerin toplu olarak değil de dilimler itibariyle serbest bırakılması, ihale sürecinin mevzuat gereği uzun sürmesi, projelerin hazırlanma, uygulama, izleme ve değerlendirme safhasındaki personel yetersizliği.

3. 2009 YILI PROJE UYGULAMALARI :

3.1. 2009H030570 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

2009 yılı yatırım projeleri Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında; Bilecik Üniversitesi Gülümbe Kampüsü Altyapı Projeleri işi için 11.000 TL, Kütüphane ve derslik binalarının zemin etüdü işi için 6.360 TL, 14 parsel kamulaştırma projeleri işi için 5.897 TL, 22 parsel kamulaştırma projeleri işi için 11.000 TL, kapalı halı saha tiribün projesi işi için 11.000 TL olmak üzere (KDV hariç 45.257 TL) 53.000 TL

harcama yapılmış olup söz konusu tutar revize proje ödeneği olan 63.000 TL nin %84 ünü oluşturmaktadır.

3.2. 2009H030580 Muhtelif İşler :

A) Makine Teçhizat, Bilgisayar, Taşıt, Yayın, Alımları:

2009 yılı yatırım projeleri muhtelif işler kapsamında; Makine teçhizat ve laboratuvar malzemeleri alımına 351.344 TL, Bilgisayar alımlarına 497.261 TL, Taşıt alımlarına 92.422 TL, Yayın alımlarına 43.725 TL olmak üzere toplamda 984.752 TL harcama yapılmış olup bu tutar ilgili proje revize ödeneği olan 2.813.000 TL nin %35 ini oluşturmaktadır.

B) Bina Onarım ve Tadilat İşleri:

I. Bilecik Üniversitesi İ.İ.B.F. Genel Onarım İşleri:

Üniversitemizin, Bilecik şehir merkezinde bulunan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlı 2 ayrı binada öğrencilerimiz ve personellerimizin daha iyi ortamlarda eğitim öğretim faaliyetleri ve akademik-idari faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için, Bilecik Üniversitesi İ.İ.B.F. Genel Onarım İşleri tamamlanarak okulumuz 2009-2010 eğitim öğretim dönemine kullanılmaya hazır hale getirilmiştir.





II. Kalorifer Kazan Dairesi Revizyon İŖi:

Üniversitemizin, Anadolu Üniversitesinden devraldığı tesislerden birisi olan kapalı spor salonu kazan dairesi yerleşkemizin büyümesi ile mevcut kapasitesinin yetersiz gelmeye başlamış olduđu görülmüştür. Yeni yapılan Prefabrik Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi ve SKS Dairesi Başkanlıklarının kullandıkları hizmet binası, mevcut kapalı spor salonunu da içerisine alan kapasiteye sahip ısı merkezi oluşturulması için revizyon işlemi tamamlanarak, revize edilen ısı merkezimiz 2009-2010 eğitim öğretim dönemine yetiştirilmiştir.



III. Osmaneli MYO Atölye Cephe Kaplaması Yapım İşi :

Yüksekokulumuzun atölye cephe kaplama işleri yapılarak 2009-2010 eğitim öğretim dönemine yetiştirilmiştir.



IV. Bozüyük MYO Yemekhane ve Kafeterya Tadilatı İŖi:

Öğrencilerimiz ve personellerimizin daha iyi ortamlarda hizmet alabilmelerini teminen Yemekhane ve kafeterya tadilat işleri tamamlanarak 2009-2010 eğitim öğretim dönemine yetiştirilmiştir.



V. Bilecik Üniversitesi MYO-Mühendislik Fakültesi Toplantı Odası ile Atölye Tadilatı İşi :

Öğrencilerimiz ve personellerimizin daha iyi ortamlarda eğitim öğretim faaliyetleri ve akademik-idari faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için, söz konusu tadilat işleri tamamlanarak okulumuz 2009-2010 eğitim öğretim dönemine kullanılmaya hazır hale getirilmiştir.



VI. Prefabrik Okul Binaları :

Üniversitemiz Gülümbe yerleşkesinde Sakarya Valiliğinden değişik zamanlarda bedelsiz olarak temin edilen prefabrik okul binalarının demontajları yapılarak 2009-2010 eğitim öğretim dönemine yetiştirilmiştir.

Mühendislik Fakültesi 1. Kısım Prefabrik Bina Montaj-Demontaj İşi :

Söz konusu iş kapsamında Mühendislik Fakültesi hizmetlerinde kullanılmak üzere 8 adet sınıf, 2 adet laboratuvar, 7 adet akademik personel odası ve ortak kullanım alanları bulunan prefabrik okul binası inşa edilerek 2009-2010 eğitim öğretim döneminde kullanılmaya başlanılmıştır.



Mühendislik Fakültesi 2. Kısım Prefabrik Bina Montaj-Demontaj İşi :

Söz konusu iş kapsamında Mühendislik Fakültesi hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet sınıf, 1 adet toplantı odası, 5 adet bölüm başkanı ve sekreteryası odası, 13 adet akademik ve idari personel odası ve ortak kullanım alanları bulunan prefabrik okul binası inşa edilerek 2009-2010 eğitim öğretim döneminde kullanılmaya başlanılmıştır.



Fen Edebiyat Fakültesi Prefabrik Bina Yapım İşi:

Söz konusu iş kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet derslik, 1 adet dekan ve sekreteryası odası, 19 adet akademik ve idari personel odası ve ortak kullanım alanları bulunan prefabrik okul binası inşa edilerek 2009-2010 eğitim öğretim döneminde kullanılmaya başlanılmıştır.



Prefabrik Binalara Ait Elektrik, Kanalizasyon ve Bilgisayar Data Altyapı İŖi:

2009-2010 eđitim dđneminde kullanılacak derslik, laboratuvar ve idari binaların tesisat, elektrik, data altyapılarının hazırlanması iŖi tamamlanarak binaların altyapı bađlantıları çekilerek hizmete hazır hale getirilmiŖtir.



2009 yılı yatırım projeleri muhtelif iŖler (bina onarım ve tadilat) kapsamında; toplamda 1.697.248 TL harcama yapılmıŖ olup bu tutar ilgili projenin revize ödeneđi olan 2.813.000 TL nin %60 ını oluŖturmaktadır.

3.3. 2009H030590 Kampüs Altyapısı:


Bilecik Üniversitesi Gülümbe Kampüsü Alt Yapı Tesisleri İnşaatı İşi :

Üniversitemiz kampus yerleşim planı çerçevesinde iç yollar inşaatı, kanalizasyon, yağmursuyu tesisatları inşaatı, tesisat galerileri inşaatının yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, gerekli projeler kampus yerleşim planı gözetilerek hazırlanmış ve işe başlanmış olup tüm imalatların %45'i tamamlanmıştır.

Kanalizasyon hattında Ø200 mm HDPE Koruge 3539 mt, Ø300 mm HDPE Koruge 391 mt olmak üzere toplam 3930 mt yağmur suyu hattının kazısı, yataklaması, gömleklemesi, boru döşemesi, dolgusu, ana hat ve parsel bacalarının imalatı bitirilmiştir.

Yağmur suyu hattında Ø300 mm HDPE Koruge 2939 mt, Ø400 mm HDPE Koruge 236 mt, Ø500 mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru 435 mt, Ø600 mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru 187 mt, Ø800 mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru 286 mt, Ø1000 mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru 269 mt, Ø1200 mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru 451 mt olmak üzere toplam 4803 mt kanalizasyon hattının kazısı, yataklaması, gömleklemesi, boru döşemesi, dolgusu, ana hat ve parsel bacalarının imalatı bitirilmiştir.

İç yollar inşaatında 3 no'lu yol(120 mt), 5 no'lu protokol yolu(123,08 mt), 6 no'lu ring yolunda(1443,04 mt) kazı işlemleri bitirilmiştir. 5 ve 6 no'lu yollarda dolgu işlemi devam etmektedir.

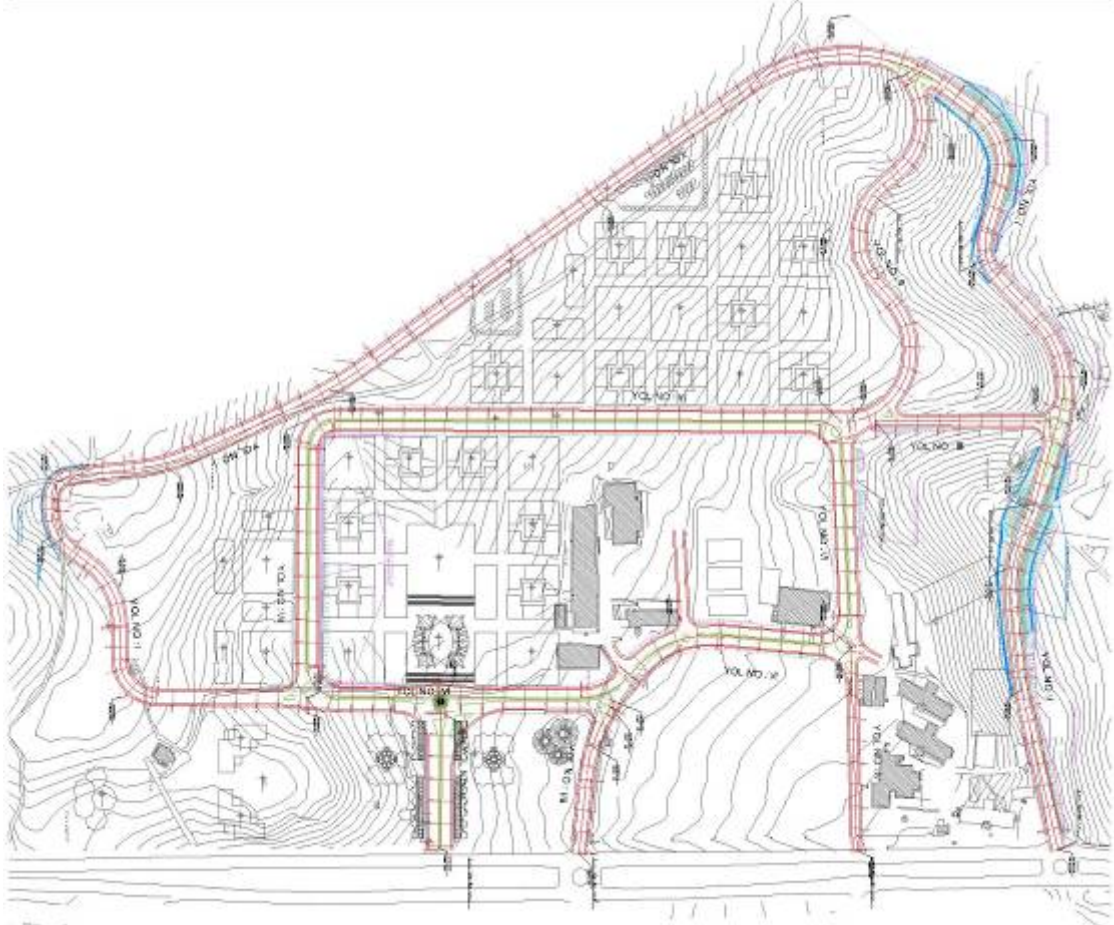







2009 yılı yatırım projeleri kampus altyapısı kapsamında; toplamda 3.170.000 TL harcama yapılmış olup bu tutar ilgili projenin revize ödeneği olan 4.720.000 TL nin %67 sini oluşturmaktadır.

3.4. 2009H03600 Derslik ve Merkezi Birimler:

Üniversitemiz derslik ihtiyacını gidermek için 2 katlı, 14 derslik, 2 laboratuvar, 10 akademik ve idari amaçlı oda ve ortak kullanım alanlarıyla birlikte 2009 m2 toplam alana sahip betonarme prefabrik okul yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda mimari, statik, mekanik, elektrik tesisat projeleri hazırlanmıştır. Okul binamızın karkasını oluşturacak elemanların imalatına başlanmıştır. Aynı zamanda temel kazıları yapılarak tekil temel kalıp planı doğrultusunda kalıplar çakılmış ve temel alt donatılarıyla birlikte soket donatıları hazırlanmaya başlanmıştır.









2009 yılı yatırım projeleri derslik ve merkezi birimler kapsamında; toplamda 426.000 TL harcama yapılmış olup bu tutar ilgili projenin revize ödeneđi olan 1.022.000 TL nin % 42 sini oluşturmaktadır.

3.5. 2008H050100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri :

Üniversitemiz 2008-2009 döneminde yapılan spor tesisleri çalışmalarını 2009-2010 döneminde daha da büyüterek Bilecik merkezdeki bulunan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve ilçelerimizde faaliyet gösteren Meslek Yüksek Okullarında spor tesisi yapılmıştır:

Üniversitemize, İ.İ.B.F. ve Osmaneli MYO için basketbol-voleybol sahası, Söğüt MYO ve Pazaryeri MYO için mini halı saha ve basketbol-voleybol sahaları kazandırılmıştır. Böylelikle spor tesislerimizin Üniversitemizin değişik yerleşkelerine de homojen yayılması sağlanarak tüm öğrencilerimiz ve çalışan personellerimizin sosyal ve sportif aktivitelerini daha rahat yapabilmeleri imkan sağlanmıştır.

Söğüt MYO Açık Spor Tesisi Yapım İşi :

Söğüt Meslek Yüksek Okulunun yerleşkesinde 800 m2 mini futbol sahası ve 640 m2 basketbol sahasını da kapsayan açık spor tesisleri yapılarak yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte öğrencilerimize ve personelimize hizmet vermeye başlamıştır.





Pazaryeri MYO Açık Spor Tesisi Yapım İşi :

Yüksek Okulumuz yerleşkesine, 800 m2 mini futbol sahası ve 640 m2 basketbol sahasını da kapsayan açık spor tesisleri yapılarak gerek öğrencilerimize gerekse akademik ve idari personelimize hizmet vermeye hazır hale getirilmiştir.





Bilecik Üniversitesi İ.İ.B.F. Açık Spor Tesisleri Yapım İşi :

Bilecik merkezde bulunan İ.İ.B.F. İşletme bölümü tarafından kullanılan binanın ön bahçesine 420 m2 basketbol-voleybol sahası yapılarak, spor tesisimiz yeni eğitim döneminde hizmet vermeye hazır hale getirilmiştir.





Osmaneli MYO Aık Spor Tesisleri Yapım İŐi:


Meslek Yksek Okulumuz yerleŐkesinde okul binamızın arka kısmına yakın blgeye 360 m2 basketbol-voleybol sahası yapılarak yeni eĐitim dnemi ile birlikte hizmet vermeye hazır hale getirilmiŐtir.





Bilecik Üniversitesi Kapalı Halı Saha Tribün Yapım İşi :

2008-2009 döneminde yapılan kapalı halı saha için kullanılmak ve Üniversitemiz Gülümbe yerleşkesindeki sosyal mekanları artırmak amacı ile içerisinde 250 m² kafeteryası, 360 kişilik tribünü, 4 ayrı soyunma odası, 1 hakem odası, 1 görevli odası, 1 malzeme odası bulunan tribün inşaatı için mimari, statik, mekanik, elektrik tesisat projeleri hazırlanmıştır. Tribün inşaatı ile birlikte yaklaşık 8 mt yüksekliğe sahip tırmanma duvarı, mevcut bulunan kapalı spor salonu içerisindeki soyunma odalarının inşaat ve tesisat tadilatları işi ile ilgili yer teslimi yapılarak tadilat işlemleri ve kazı imalatları başlamıştır.

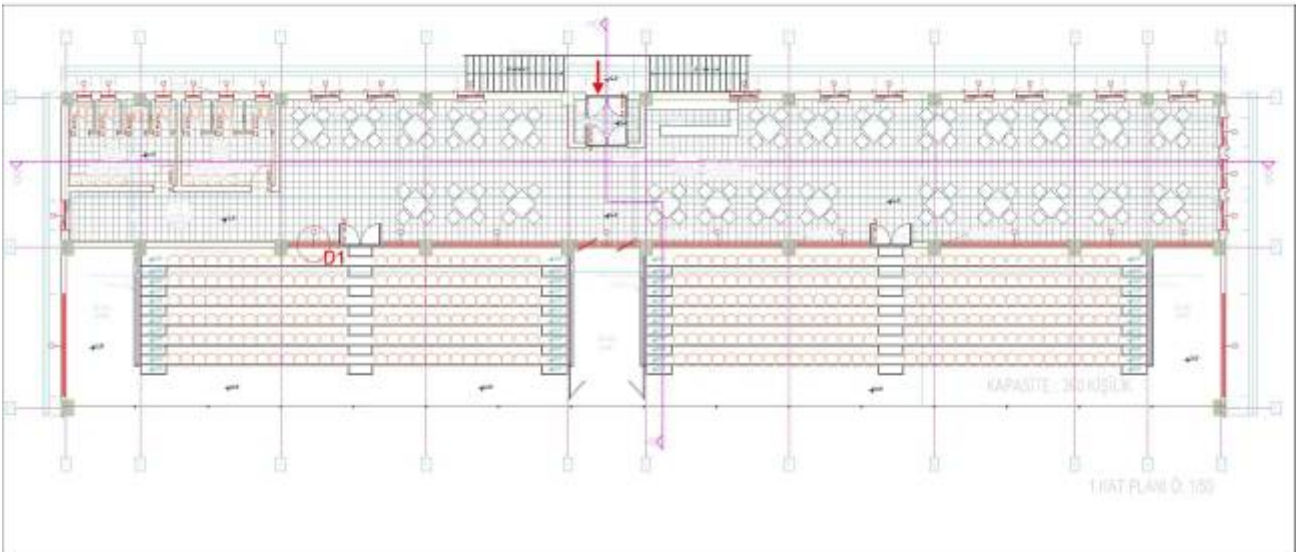







2009 yılı yatırım projeleri açık ve kapalı spor tesisleri kapsamında; toplamda 411.000 TL harcama yapılmış olup bu tutar ilgili proje ödeneği olan 1.000.000 TL nin % 41 ini oluşturmaktadır.

4. ÖNERİLER :

Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin ayrıntılı harcama programı hazırlanırken kurumların ihtiyaçlarına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının ayrıca ödeneklerin tamamının ilk 3 aylık veya ilk 6 aylık dönemde serbest bırakılmasının, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracağı düşünülmektedir.

