



**BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ**  
**2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME**  
**RAPORU**

**Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı**  
**2018**

## 1. GENEL DEĞERLENDİRME

### 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanuna ekli II. Sayılı Cetvelde yer alan Özel Bütçeli İdareler arasında yer almaktadır.

Gelirlerimiz; hazine yardımları ile öz gelirlerden (Örgün ve ikinci öğretim harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, tezli ve tezsiz yüksek lisans gelirleri, kira gelirleri ve diğer gelirler) oluşmaktadır.

2017 yılındaki yatırımlarımız; Bütçe Kanunuyla Üniversitemiz için uygun görülen hazine yardımları ve likit karşılığı ödenek ilaveleri ile finanse edilmiştir.

### 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemizin 2017 yılı sonu itibariyle 841.051,00 m<sup>2</sup> açık alanı, 134.316,10 m<sup>2</sup> kapalı alanı mevcuttur.

Üniversitemizde birimlere ait mevcut derslik, laboratuvar ve atölye sayıları ile öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİRİM ADI	DERSLİK SAYISI (ADET)	LABORATUAR ve ATÖLYE SAYISI (ADET)	ÖĞRENCİ SAYISI
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	26	10	4186
Mühendislik Fakültesi	28	33	1492
Fen – Edebiyat Fakültesi	32	8	1760
Fen Bilimleri Enstitüsü	-	-	411
Sosyal Bilimler Enstitüsü	-	-	824
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi	11	1	76
İslami ilimler Fakültesi	11	1	61
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi	19	10	212
Meslek Yüksek Okulu	16	25	2556
Söğüt Meslek Yüksekokulu	9	4	1241
Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu	12	2	1079
Osmaneli Meslek Yüksek Okulu	27	4	1039
Gölpazarı Meslek Yüksekokulu	19	2	642
Bozüyük MYO, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	27	3	1138
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sağlık YO	14	1	1050
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	0	9	-

Tablo-1

### 1.3. 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı/ İyileşme:

Üniversitemizin fiziki, teknik altyapı ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Futbol Sahası Tribün Yapım İşi 2017 yılında başlanmış olup önümüzdeki yatırım döneminde eğitim-öğretim ve spor faaliyetlerine başlanması planlanmaktadır.

Mevcut ve yeni açılan birimlerin mal/malzeme ve hizmet ihtiyaçları ile bilişim teknolojileriyle ilgili sistem ve donanımlarının güçlendirilmiştir.

## 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları:

SEKTÖR	2017 YILI ÖDENEĞİ (TL)		2017 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (TL)	2017 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	
	PROGRAM ÖDENEK	REVİZE ÖDENEK		PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE	REVİZE ÖDENEĞE GÖRE
<b>EĞİTİM</b>					
1-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	248.000	248.000	248.000	100	100
2-Muhtelif İşler	3.500.000	4.236.000	3.844.000	110	91
3-Kampüs Altyapısı	5.000.000	5.000.000	22.000	1	1
4-Derslik ve Merkezi Birimler	16.000.000	16.000.000	0	0	0
5-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	3.000.000	3.000.000	1.985.000	66	66
6- Yayın Alımları	250.000	250.000	171.000	68	68
7-Merkezi Araştırma Lab. İlave Altyapı (*)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
<b>Toplam</b>	<b>29.498.000</b>	<b>30.234.000</b>	<b>7.770.000</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
*Söz konusu projeye ilişkin ihale hazırlık çalışmaları devam etmekte olup, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin Yükseköğretim kurumları bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarılarak kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine esas ve usuller uyarınca, 1.500.000.-TL ödenek Üniversiteye ait 48343347-5022 nolu özel hesaba aktarılmıştır.					

**Tablo-2**

Üniversitemizin, 2017H030110 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında gerçekleşen yatırım %100, 2017H030120 nolu Muhtelif İşler kapsamında gerçekleşen yatırım %110, 2008H050100 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri kapsamında gerçekleşen yatırım %66, 2017H030130 nolu Yayın Alımları kapsamında gerçekleşen yatırım %68, 2017K120950 Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı kapsamında gerçekleşen yatırım %100, 2009H030590 Kampüs Altyapısı kapsamından gerçekleşen yatırım %1'dir.

## 2. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 2.1 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (2017H030110)

2017 yılı içerisinde etüd proje gideri olarak harcama kalemleri içerisinde; Kalite ve Plan Kote Projeleri, Mimari ve Statik Projeler, Zemin Etüt ve İyileştirme Projeleri ( Geoteknik Projeler ), Emlak ve Gayrimenkul Değerleme Raporu, İsrar Tevhid ve Harita ile ilgili Projeler yapılmıştır.

### 2.2 Muhtelif İşler (2017H030120):

Büro ve işyeri mefruşatı, makine teçhizat alımları ve bilgisayar yazılımı ve lisans alımları kapsamında, toplam 1.909.990,13.-TL harcama yapılmıştır. Büyük onarımlar kapsamında ise 1.934.714,72.-TL harcama yapılmıştır.

### 2.2.1 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Aşağıköy Yerleşkesi Genel Onarım İşi

Söz konusu onarım işiyle;

- Yerleşkede bulunan idare binası, Lojman binası ve soğuk-sıcak hava depolarının bulunduğu kısımlardaki tüm pvc sistemi değiştirilmiştir.
- Soğuk Hava deposunun olduğu kısımdaki alan bölünerek yeni depolama alanı oluşturulmuş
- Sıcak hava deposu ve soğuk hava deposunun arasındaki kısma dışarıdan bölme yapılarak araç girişine izin verilmiştir.
- Binanın dışına kilit parke taşından yapılmak suretiyle tretuar yapılmıştır.
- Binaya Güvenlik personelinin daha rahat çalışabilmesi amacıyla bölme yapılmıştır.
- İdare binası ve lojman binasının çatıları onarılarak aktarma yapılmıştır gereken mahya ve Marsilya tipi kiremitler değiştirilmiştir.
- Lojman binasının dış cephe boyası yapılmıştır.
- Binalardaki korkuluklar boyanmıştır.

### 2.2.2 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli MYO Genel Onarım İşi

Söz konusu onarım işiyle;

- Yüksek Gerilim sistemleri modernizasyonu ve enerji kesintilerinde kullanmak üzere jeneratör sistemi yapılmıştır.
- Bina asansör sistemi yapılmıştır.
- Bu iş kapsamında binanın engelli kullanımına elverişli hale getirilmesi amacıyla bazı özel imalatlar yapılmış ve zemin katta yeni bir kapalı alan oluşturulmuştur.
- Yangın algılama ve uyarı sistemleri yapılmıştır.
- Bina giriş ve kafeterya aydınlatmaları yapılmıştır.
- Engelli lavabo yapılmıştır.
- Engelliler için izli yollar yapılmıştır.
- Isıtma sistemlerinde düzenlemeler yapılmıştır.

### 2.2.3 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüs ve Gölpaazarı MYO Genel Onarım İşi

Söz konusu onarım işiyle;

- Gölpaazarı MYO' da Jeneratör kaidesi betonu atılmıştır.
- Engelli wc düzenlemesi yapılmıştır.
- İz yolların yapımı tamamlanmıştır.
- Merdivenlere kaydırmazlık bant yapılmıştır.
- Merkez Kampüs merdiven kırımı yapılmıştır.
- Mekanik tesisat onarımı yapılmıştır.
- Wc yalıtım şapı ve yer karosu yapılmıştır.
- Hem Merkez yerleşke hem de Gölpaazarı MYO' da Engelli Asansörleri yapılmıştır.
- B blok çatısındaki 4 adet kuleye gizli çatı yapılmıştır.
- MYO ön ve arka girişlerine ve atölye binasına demir imalattan kapı yapılmıştır.
- MYO merdiven seramikleri yenilenmiştir.
- Isıtma hatları değiştirilmiştir.
- Yangın dolabı ve hattı ekleme işleri ivedilikle bitirilerek bina kullanıma açılmıştır.

### 2.3 Kampüs Altyapısı (2009H030590)


Üniversitemiz kampüs altyapısının geliştirilmesiyle alakalı 1. Etap altyapı projeleri tamamlanmıştır. Büyüyen ve gelişen üniversitemiz için artan ihtiyaçlar neticesinde 2. Etap altyapı çalışmaları için kamulaştırma alanları belirlenmiş olup arsa sahipleriyle ve mirasçılarıyla görüşmeler son aşamaya gelmiştir. Bu süreç ivedilikle bitirilerek 2. Etap altyapı için proje çalışmalarına başlanacaktır.

### 2.4 Derslik ve Merkezi Birimler (2009H030600)


2017 yılı içerisinde söz konusu proje konusunda ihale çalışmaları tamamlanmış herhangi bir imalat yapılmamıştır.

### 2.5 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (2008H050100)

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Futbol Sahası Tribün Yapım İşi ile alakalı kazı ve dolgu aşaması ve Fore kazık imalatı bitirilmiştir. Çevre perde duvarlarının %60'ı bitirilmiş olup tribün temel işlemleri tamamlanmıştır. Portatif tribün ankraj imalatları ve kalıp ve donatı bağlama işlemleri devam etmektedir. Proje 2018 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

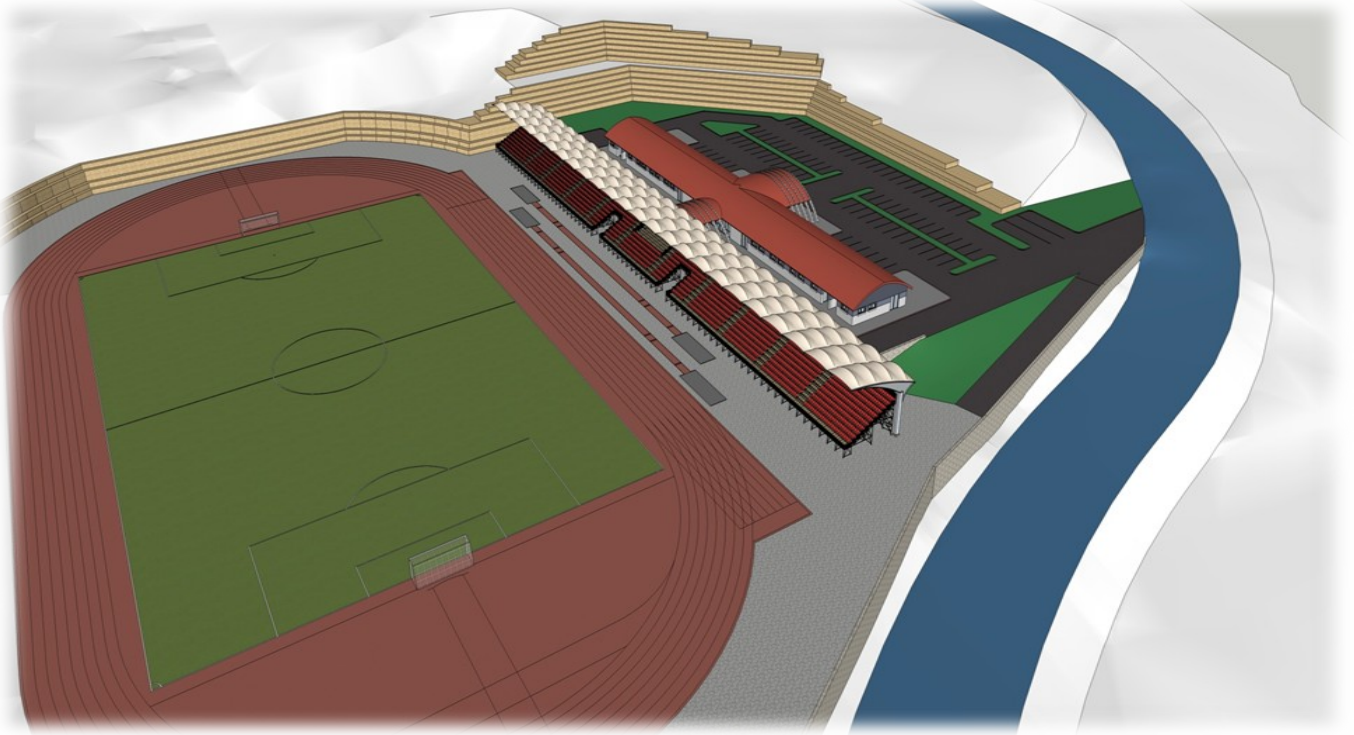

Resim-1

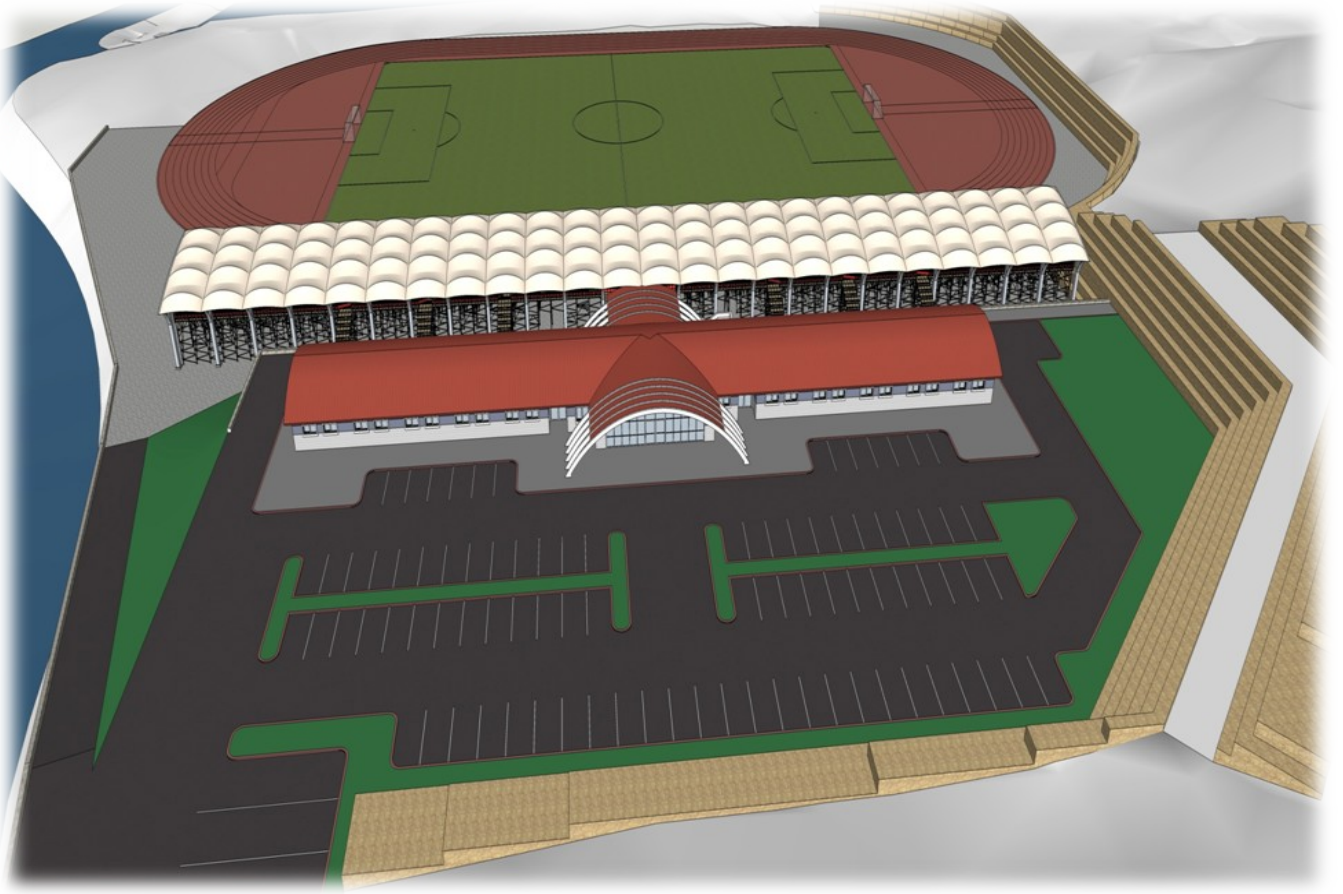

**Resim-2**



**Resim-3**



**Resim-4**



**Resim-5**



**Resim-6**



**Resim-7**





**Resim-8**



**Resim-9**



**Resim-10**



**Resim-11**

## **2.6 Yayın Alımları (2017H030130):**

2017 Yılı Yatırım Programında, yayın alımlarına ilişkin olarak toplam harcama 171.196.-TL' dir.

## **2.7 Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı (2017K120950)**

2017 yılı içerisinde söz konusu proje konusunda ihale çalışmaları tamamlanmış herhangi bir imalat yapılmamıştır.

## **3. TAMAMLANAN ÇOK YILLIK PROJELER (PROJE TAMAMLAMA RAPORU)**

2017 Yılı Yatırım Programında, yeni proje numarası alan ve tamamlanan çok yıllık proje bulunmamaktadır.

## **4. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER**

Kurumların, tertip düzeyinde aylar itibariyle yapabilecekleri harcamaları, gelir gerçekleşme tahminlerini ve net finansmanlarının kullanımına ilişkin öngörülerini gösteren Ayrıntılı Finansman Programının özellikle yatırım ödenekleri bakımından kurumların teklifleri dikkate alınarak yapılmasının uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracığı düşünülmektedir.
